



OFICIO ELECTRÓNICO

ORD. N° : 3311  
ANT. : PROYECTO ESPECIALIDADES PUNTA ANGAMOS, ANTOFAGASTA.  
MAT. : ENVÍA OBSERVACIONES A PROYECTO ESPECIALIDADES PUNTA ANGAMOS, ANTOFAGASTA.  
ADJ. :

Antofagasta, 23 diciembre 2025

**A : JUAN ALVARADO CASTILLO  
INGENIERO CIVIL  
DE : ROBINSON ESPEJO CHEPILLO  
JEFE (S) DEPARTAMENTO TÉCNICO DE CONSTRUCCIONES Y  
URBANIZACIÓN.**

En relación con el proyecto de rotura y reposición de pavimentación mencionado en el antecedente, comunico a usted las siguientes observaciones:

## **A. PAVIMENTO PLAZA PUNTA ANGAMOS.**

### **1. MEMORIA DE DISEÑO**

1.1. Definir la clasificación de la vía.

**PROYECTO MEJORAMIENTO PLAZA PUNTA ANGAMOS, ENTRE CALLES ISABEL LA CATOLICA, PASAJE MAPOCHO Y PASAJES COLOSO PONIENTE Y COLOSO ORIENTE  
TIPO DE VIA: LOCAL/PASAJE**

Nombre Calle o Psje	Desde	Hasta	Tipo Vía
Psje Mapocho	Psje Coloso Poniente	Psje Coloso Oriente	Local/Pasaje
Isabel la Católica	Psje Coloso Poniente	Psje Coloso Oriente	Local
Psje Coloso Poniente	Psje Mapocho	Isabel la Católica	Local/Pasaje
Psje Coloso Oriente	Psje Mapocho	Isabel La Católica	Local/Pasaje

### **2. MECÁNICA DE SUELOS**

2.1. No entrega SST para Plaza Punta Angamos.


### **3. PLANOS**

#### **3.1. Demolición**

3.1.1. Incorporar la Línea Oficial

3.1.2. Línea de solerilla a demoler en planta no coincide con la línea de simbología.

3.1.3. Indicar señaléticas a retirar y/o mantener.

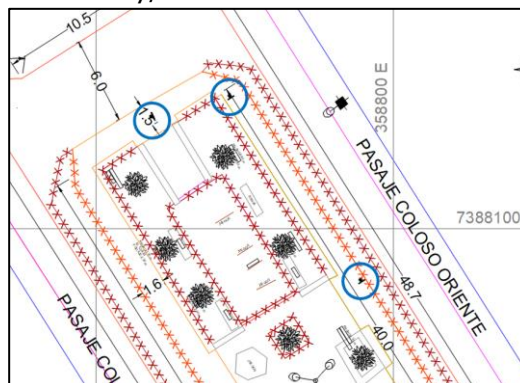

### **3.2. Diseño Geométrico**

- 3.2.1. Incorporar a la planta y a la simbología las solerillas repuestas indicadas en el presupuesto.
- 3.2.2. Agregar la "Línea Oficial DOM" mostrada en simbología al dibujo en planta.
- 3.2.3. Por falta de ensayo SST, incorporar mejoramiento en la superficie de estacionamiento.

### **3.3. Seguridad Vial**

- 3.3.1. Incorporar a carpeta la aprobación de tránsito y plano firmado.

## **4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

- 4.1.1. Incorporar retiro de señalética existente.

## **5. PRESUPUESTO**

- 5.1. Incorporar partida para suministro de señalética.
- 5.2. Verificar cantidades de las partidas 7.1.2 y 7.4.3.

## **B. PAVIMENTO PLAZA MANUEL RODRIGUEZ**

### **1. MEMORIA DE DISEÑO**

- 1.1. En apartado 2 "Diseño Estructural", incorporar bajo la base granular el mejoramiento al diseño de calzada y acera por SST elevadas.

### **2. PLANOS**

#### **2.1. Diseño Geométrico**

- 2.1.1. Incorporar mejoramiento de calzada (considerado en presupuesto) a los cortes A-A, B-B y C-C e indicar espesor del mejoramiento en vereda y calzada.

#### **2.2. Seguridad Vial**

- 2.2.1. Incorporar a carpeta la aprobación de tránsito y plano firmado.

### **3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.**

- 3.1. Corregir I.T.O. por F.T.O.
- 3.2. Corregir solera en apartado 5.1.2

#### **5.1.2 Unidad de medida y pago**

La unidad de medida corresponde a metros lineales (ml) de Solera tipo B instalada y recibida por la Inspección Técnica de la Obra, de acuerdo a los perfiles del proyecto. Su precio incluirá la provisión de todos los materiales, mano de obra, movimiento de tierras y maquinarias necesarias para una correcta ejecución de la partida.

### **4. PRESUPUESTO**

- 4.1. Diferenciar mejoramiento de acera y mejoramiento de calzada, ya que tienen diferente espesor entre sí.
- 4.2. Para la partida 7.1 del presupuesto considerar el precio de la partida 7.3 del listado de precios 2025.

## **C. PAVIMENTO VICUÑA.**

### **1. PLANOS**

#### **1.1. Demolición**

- 1.1.1. La demolición de calzada debe ser de 0,5 m y abarcar todo el largo donde se extraiga solera.

#### **1.2. Seguridad Vial.**

- 1.2.1. Incorporar a carpeta la aprobación de tránsito y plano firmado.

### **2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.**

- 2.1. Cambiar ITO por FTO.

### **3. PRESUPUESTO**

- 3.1. Corregir cantidad de demolición de calzada.

Saluda atentamente a Ud.

**ROBINSON ANTONIO ESPEJO CHEPILLO**

**JEFE (S) DEPARTAMENTO TÉCNICO DE CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIÓN.**

MMT/CLA/AMH

Distribución

- JUAN ALVARADO CASTILLO - JALVARADO@IN3.CL
- MAURICIO MELENDEZ - CARPETA DE REVISIÓN.
- RODRIGO ZAMORANO - ADMINISTRADOR DE CONTRATO
- CRISTIAN GODOY - ENCARGADO PROGRAMA RECUPERACIÓN DE BARRIOS
- LUZ ZAPATA - SERGIO SÁNCHEZ - ENCARGADA DE TRANSPARENCIA.
- OFICINA DE PARTES SERVIU ANTOFAGASTA.

Ley de Transparencia Art 7.G
